

議案第 1 号

工事請負契約の一部変更について

令和 6 年第 2 回筑西市議会定例会において議決を受けて締結した筑西市立明野幼稚園施設解体工事の請負契約の一部を下記のとおり変更することについて、筑西市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成 1 7 年条例第 4 6 号）第 2 条の規定により、議会の議決を求める。

記

1 契約の名称及び議決年月日

契約の名称 筑西市立明野幼稚園施設解体工事

議決年月日 令和 6 年 6 月 2 1 日

2 変更の内容

契約金額 変更前 金 1 9 0, 7 9 5, 0 0 0 円

変更後 金 2 5 0, 4 5 9, 0 0 0 円（増加額 5 9, 6 6 4, 0 0 0 円）


令和 7 年 1 月 1 4 日提出

筑西市長 須 藤 茂

筑西市立明野幼稚園施設解体工事概要

- 1 工 事 名 筑西市立明野幼稚園施設解体工事(第1回変更)
- 2 工 事 場 所 筑西市成井622番地
- 3 契約の相手方 筑西市蓬田350番地4
株式会社常陸建設
代表取締役 飯 島 賢 一
- 4 契 約 金 額 変更前 190,795,000円(税込)
変更後 250,459,000円(税込)
増加額 59,664,000円(税込)
- 5 工 期 変更前 令和6年6月22日から令和7年1月20日まで
変更後 令和6年6月22日から令和7年8月29日まで
(221日間延長)
- 6 変 更 概 要 (1) 保育棟屋根アスベスト付着コールタール除去工事
(2) 管理棟屋上アスベスト付着コールタール除去工事
(3) 焼却灰掘削工事
(4) 浄化槽撤去工事
(5) 工事の一時中止に伴う費用

筑西市立明野幼稚園施設解体工事 追加工事箇所

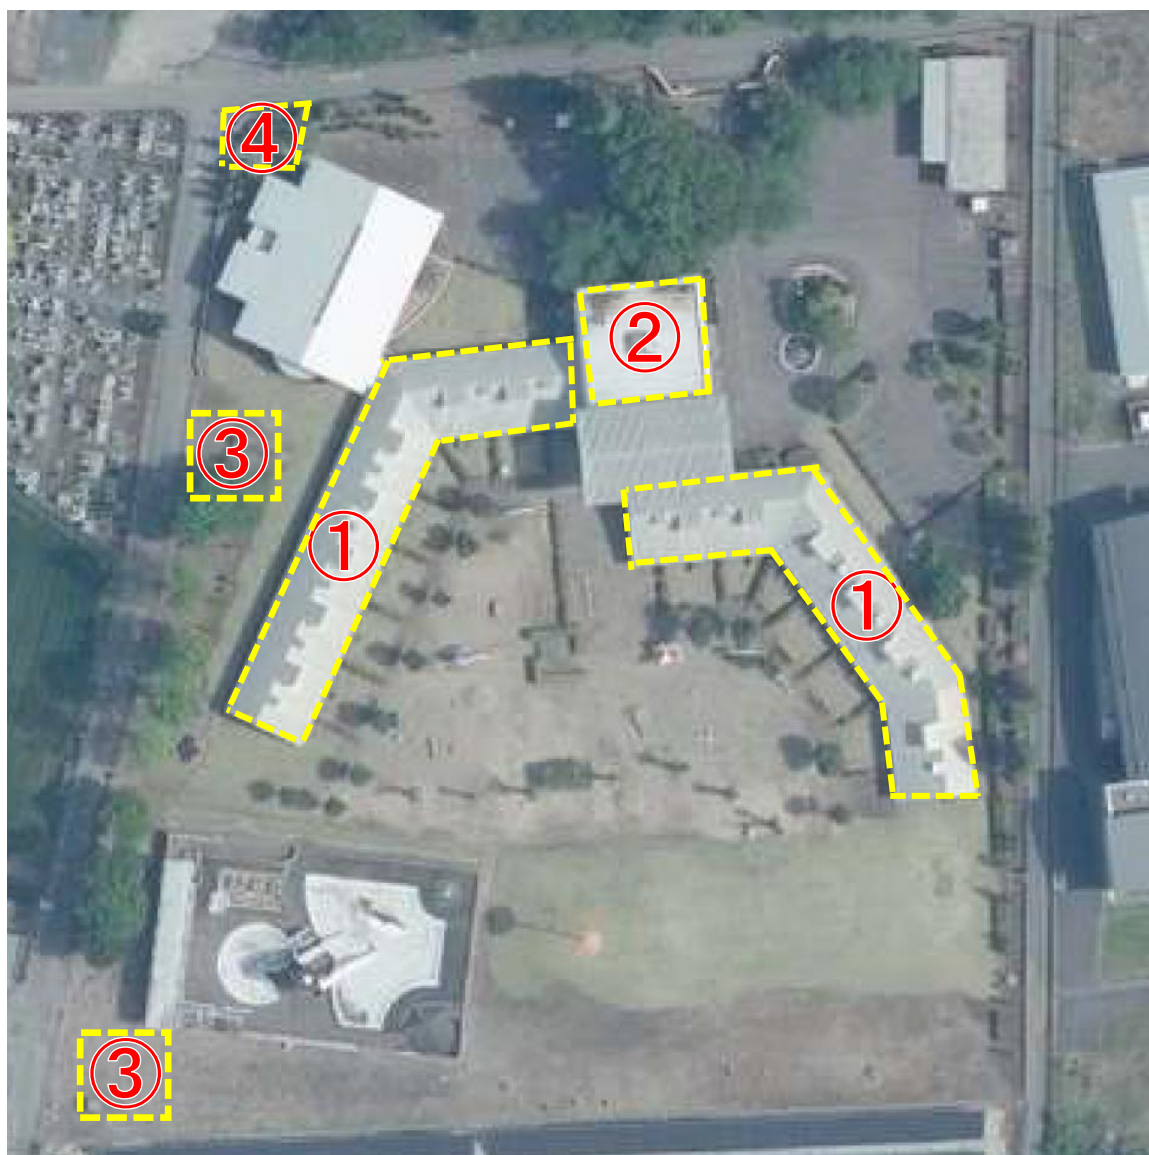

No.	場 所	内 容
①	保育棟屋根（東西）	アスベスト付着コールタール除去工事
②	管理棟屋上	アスベスト付着コールタール除去工事
③	遊戯室南側・プール南側	焼却灰掘削工事
④	遊戯室北側	浄化槽撤去工事
